

Опросный лист для заказа УВРУ на два трансформатора с отходящими линиями мощностью до 400 кВА

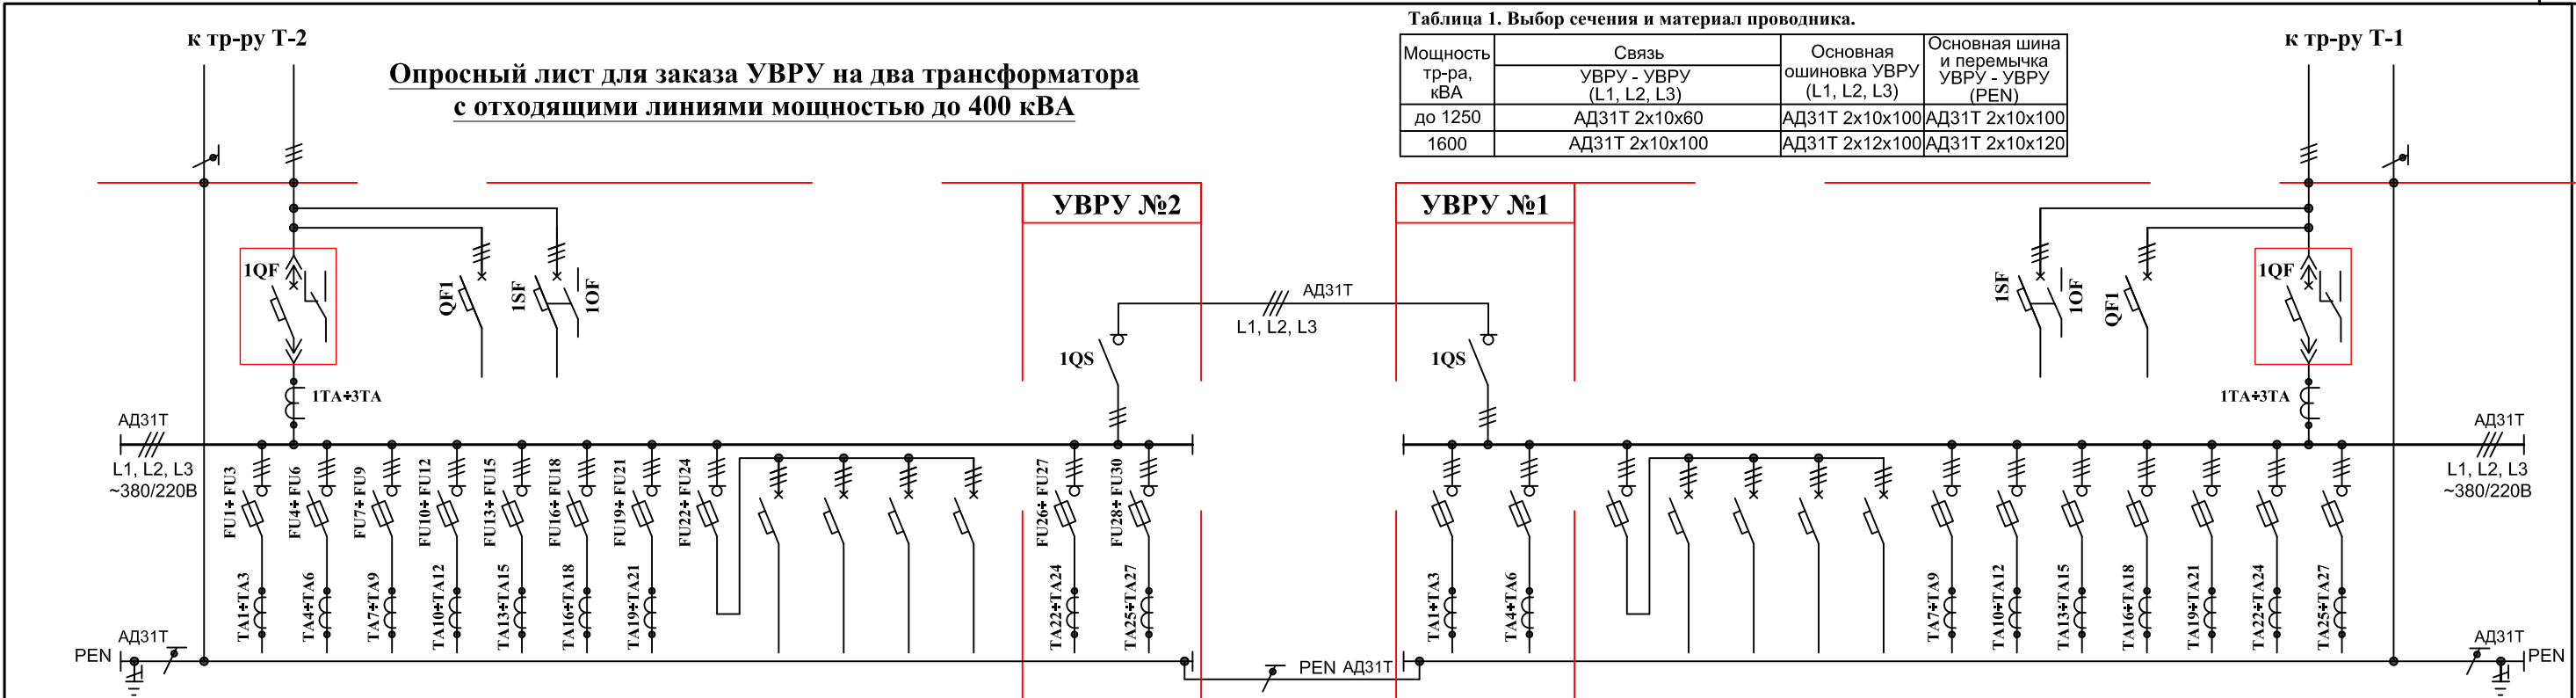
[illegible]


Таблица 2. Выбор оборудования.

Поз. обозначение	Тип оборудования		Количество		Примечание
			УВРУ №1	УВРУ №2	
1QF	Автоматический выключатель *	BA50-45Протон25 (Протон40) с MPTпроGF	1	1	Iном=
		BA50-45 DMX с GF+			
		HGS25B (HGS32B) с GPR-LP (Hyundai)			
		HGN25B (HGN32B) с GPR-LP (Hyundai)			
		Masterpact NW25 (NW32) с Micrologic 6.0A			
		OptiMat A с MR 8.0 (КЭАЗ)			
TA1+TA3	Трансформатор тока на вводе*	НА8G с расцепителем М (Chint)	3	3	Iном=
		ТШП-0,66 кл.т. 0,5S (1500/5; 2000/5)			
		ТШЛ-0,66 кл.т. 0,5S (2500/5; 3000/5)			
		МАК-ру 86/60 кл.т. 0,5S (1500/5)			
1QS	Выключатель нагрузки/рубильник *	МАК-ру 140/100 кл.т. 0,5S (2000/5; 2500/5; 3000/5)	1	1	Iном= (с блоком доп. контактов)
		OT 2000A (2500A)			
		OptiSwitch DI 2000A (2500A)			
QS1+QS10	Планочные предохранители-выключатели-разъединители *	I.SE.RE 1800A (2400A)	10	10	Iном=630 А
		APATOR ARS-3-1S-TM2			
		Jean Muller SL3-3			
FU1+FU30	OptiVert 3-1-M				
TA1+TA27	Плавкие предохранители серии ППН-39 *				габарит 3 (630A)
QF1	Трансформатор тока на отходящих линиях*				см. таблицу 3
QF2	Автоматический выключатель BA47-125 3С 15кА		1	1	Iном=100 А
QF3	Автоматический выключатель модульный BA47-29-3С		1	1	Iном=16 А
QF4	Автоматический выключатель модульный BA47-29-3С		1	1	Iном=32 А
QF5	Автоматический выключатель модульный BA47-29-3С		1	1	Iном=40 А
1SF	Автоматический выключатель модульный BA47-29-3С		1	1	Iном=63 А
	Автоматический выключатель модульный BA47-100 3С с блок-контактом		1	1	Iном=10 А

Таблица 3. Выбор ТТ на отходящих линиях.

Тип оборудования	Тип трансформаторов тока
ППВР (QS1+QS10)	ТШП-0,66 кл.т. 0,5S: 100/5; 150/5; 200/5; 250/5; 300/5; 400/5; 500/5; 600/5 А
	МАК-гу 62/30 кл.т. 0,5S: 100/5; 150/5; 200/5; 250/5; 300/5; 00/5; 500/5; 600/5 А

План расположения



Примечание:

* - количество, номинал, тип указать при привязке проекта

На резервных линиях аппараты защиты, приборы учета и трансформаторы тока не устанавливаются.

Предусматривается место под их установку.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата					
ГИП								Стадия	Лист	Листов
Разработал										
Проверил										
						Опросный лист для заказа УВРУ на два трансформатора с отходящими линиями мощностью до 400 кВА		ООО "ЭМ 55"		
Н.контроль										
