

Опробный лист для заказа УВРУ на один трансформатор с одной отходящей линией мощностью более 400 кВА

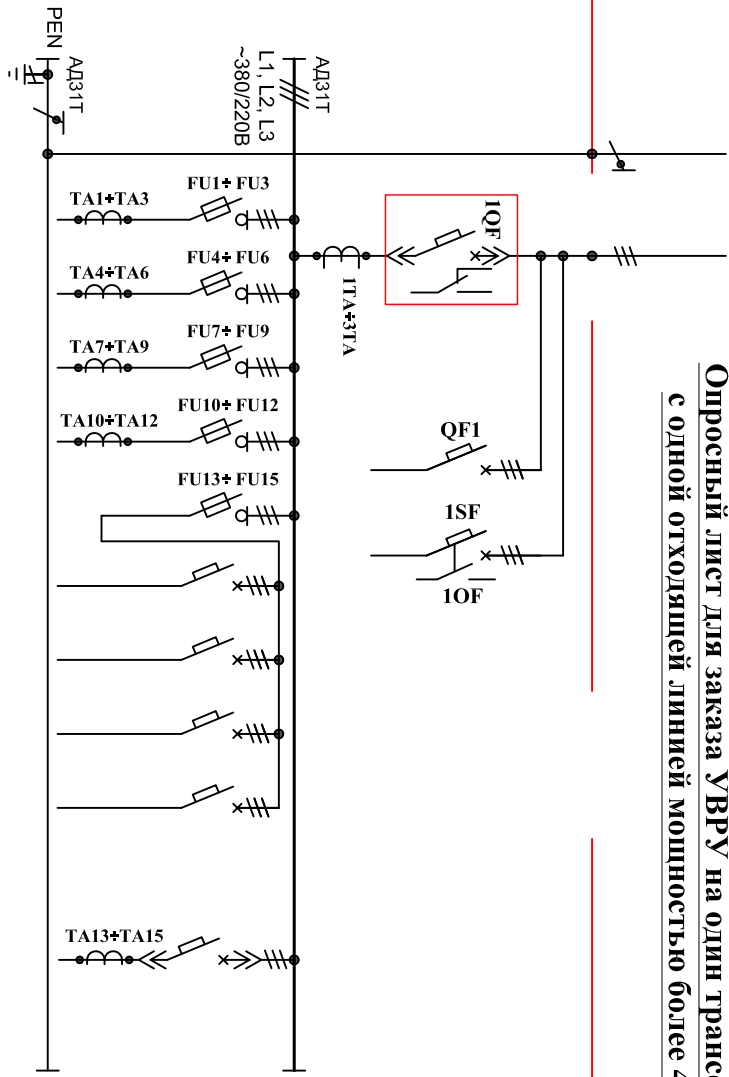
[illegible]

Таблица 1. Выбор сечения и материал проводника.

Мощность тр-ра, кВА	Основная олиновка УВРУ (L1, L2, L3)	Основная шина (PEN)
до 1250	АД31Т 2х10х100	АД31Т 2х10х100
1600	АД31Т 2х12х100	АД31Т 2х10х120

Таблица 2. Выбор оборудования.

Поз. обозначение	Тип оборудования	Кол-во	Примечание
1QF	Автоматический выключатель *	1	Inom=
	BA50-451Pro Протон25(Протон40) с МРТпроGF		
	BA50-45 DMX с GF+		
	HGS25B (HGS32B) с GPR-LP (Hyundai)		
	HGN25B (HGN32B) с GPR-LP (Hyundai)		
TA1+TA3	Mastercraft NW25 (NW32) с Micrologic 6.0A	3	Inom=
	OptiMat A с MR 8.0 (КЭАЗ)		
	MA8G с расцепителем M (Chint)		
	ТПШ-0,66 кЛ.Т. 0,5S (1500/5; 2000/5)		
	ТПШ-0,66 кЛ.Т. 0,5S (2500/5; 3000/5)		
QS1+QS5	МАК-пл 86/60 кЛ.Т. 0,5S (1500/5)	5	Inom=630 A
	МАК-пл 140/100 кЛ.Т. 0,5S (2000/5; 2500/5; 3000/5)		
	АРАТОР АРС-3-1S-TM2		
FC1+FC15	Jeon Muller SL3-3		
TA1+TA15	OptiVent 3-1-M		
QF1	Плавкие предохранители серии ППН-39 *		габарит 3 (630A)
QF2	Трансформатор тока на отходящих линиях*		см. таблицу 3
QF3	Автоматический выключатель BA47-125 3С, 15kA	1	Inom=100 A
QF4	Автоматический выключатель модульный BA47-29-3С	1	Inom=16 A
QF5	Автоматический выключатель модульный BA47-29-3С	1	Inom=32 A
1SF	Автоматический выключатель модульный BA47-29-3С	1	Inom=40 A
	Автоматический выключатель модульный BA47-100 3С, с блок-контактом	1	Inom=63 A
	BA50-451Pro Протон25 с МРТпро (In=800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 A)		Inom=10 A
QF6	Автоматический выключатель *	1	Inom=
	BA50-45 DMX с GF+		
	Hyundai HGN/HGS с GPR-LR (In=800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 A)		
	Hyundai HGN/HGS с GPR-LR (In=800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 A)		

Таблица 3. Выбор ТТ на отходящих линиях.

Тип оборудования	Тип трансформаторов тока
ЛПБР (QS1+QS5)	ТШП-0,66 кВ.т. 0,5S: 100/5; 150/5; 200/5; 250/5; 300/5; 400/5; 500/5; 600/5 А МАК-чу 62/30 кВ.т. 0,5S: 100/5; 150/5; 200/5; 250/5; 300/5; 0,0/5; 500/5; 600/5 А

Примечание:
* - количество, номинал, тип указать при привязке проекта
На резервных линиях аппараты защиты, приборы учета и трансформаторы тока не устанавливаются
Предусматривается место под их установку.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата					
ГВП										
Разработал										
Проверил										
						Опросный лист для заказа УВРУ на один трансформатор с одной отходящей линией мощностью более 400 кВА				
Н.контроль							ООО "ЭМ 55"			
						Стадия		Лист	Листов	
